
Gennemgangsmøde med grundejerforeningen Højbo

14-05-2025

Sag: **6-06472 Ca. 27 km styrede underboringer til 30kV kabelanlæg i Storkøbenhavn**

Mødedato: Mandag 12.05.2024 kl. 13.30 til 14.00

Mødested: Grækenlandsvej 148, 2300 København S.

Deltagere: Dinny Flintholm Entrepriseleder, Petri og Haugsted	Difl@petri-haugsted.dk	27 51 47 51
Thomas Saron Bygherre/Senior projektleder, Nexel (Ref.)	Tsa@nexel-dk.dk	42 50 60 07
Daniel Hansson Bygherre/Tilsynsførende, Nexel	Danha@nexel-dk.dk	30 33 31 96
Jørgen Mortensen Bygherre/30 kV Tilsynsspecialist, Nexel	Jmort@Nexel.dk	30 35 12 65
John Rasmussen Grundejerforeningen Højbo's formand	Johnrasmussenamager@hotmail.com	21 30 73 35
Ole Krogshøj Nielsen Grundejerforeningen Højbo's kasserer	On1601@yahoo.dk	40 63 30 47

Dagsorden


1. Præsentation af projektet
2. Arbejdsplan – Tidsplan
3. Placering af jordcontainerne på Grækenlandsvej
4. Varslingsbrevet
5. Oversigtskort for hele boringsprojektet
6. Eventuelt

1 Præsentation af projektet

Thomas Saron som repræsenterer bygherre, orienterede kort om hvad projektet omhandler og grunden til hvorfor, at Nexel har brug for at grave i Adriansvej. Egentlig er det Radius der ejer kablerne i jorden, men de benytter datterselskabet Nexel, som er et driftsselskab til at udfører Radius projektet.

ID	Opgaveid	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato
1		Adriansvej			
2					
3					
4		Uddeling af Varslinger til beboere	1 dag	ma 26-05-25	ma 26-05-25
5		Opsætning af parkering forbudt skilte med info	27 dage	to 29-05-25	fr 04-07-25
6		Etablering af Containerplads	1 dag	fr 30-05-25	fr 30-05-25
7		Gravning fra Grækenlandsvej mod Amagerbrogade	25 dage	ma 02-06-25	fr 04-07-25
8		Gravning fra Amagerbrogade mod Grækenlandsvej	25 dage	ma 02-06-25	fr 04-07-25
9		Løbende Retablering	25 dage	ma 09-06-25	fr 11-07-25
10					
11		Aflieferne samt mangleleennemane	1 dag	ti 15-07-25	ti 15-07-25

3 Placering af jordcontainerne på Grækenlandsvej

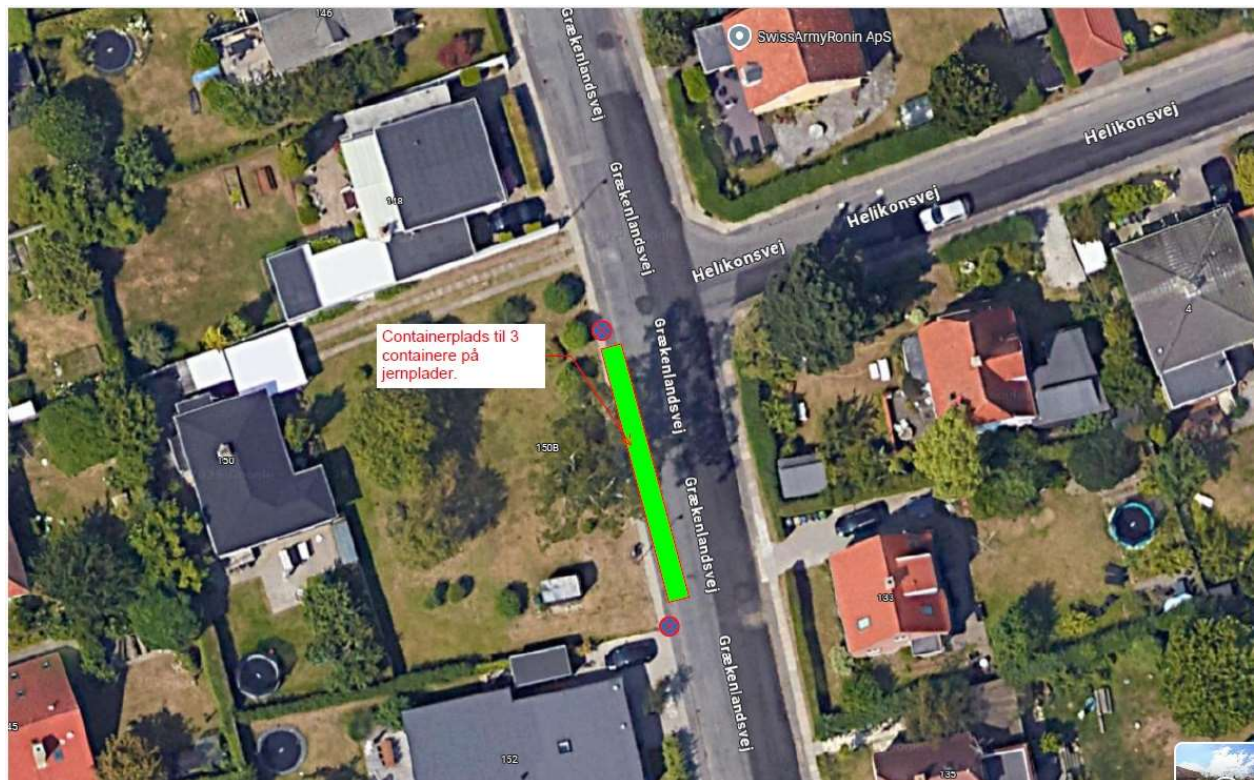

4 Varslingsbrevet

Det blev ydermere aftalt at varslingsbrevet skulle uddeles i god tid, så alle var blevet informeret i tide. Selve teksten ses på næste side.

Vi graver til fremtidens elkabler

Entreprenør Petri & Haugsted A/S udfører arbejdet for Radius Elnet.

Vi udbygger elnettet på Adriansvej, hvor vi graver nær indgange, overkørsler og p-båse.

Gravearbejdet starter d. 26. maj 2025

Arbejdet forventes afsluttet senest d. 11. juni 2025

Vi retablerer området løbende og sikrer fri passage ved indgange og overkørsler. Der er dog ikke muligt at parkere i de afmærkede P-båse i perioden.

Vi gør, hvad vi kan, for at mindske generne undervejs.

Med venlig hilsen

Petri & Hausted

Spørgsmål til gravearbejdet?

Kontakt Petri & Haugsted: info@petri-haugsted.dk eller tlf. 44 88 77 00


Spørgsmål til den generelle udbygning af elnettet?

Kontakt Radius: kundesupport@radiuselnet.dk eller tlf. 70 20 48 00.



radius

5 Oversigtskort for hele projektet
Stade den 14.05.2025:

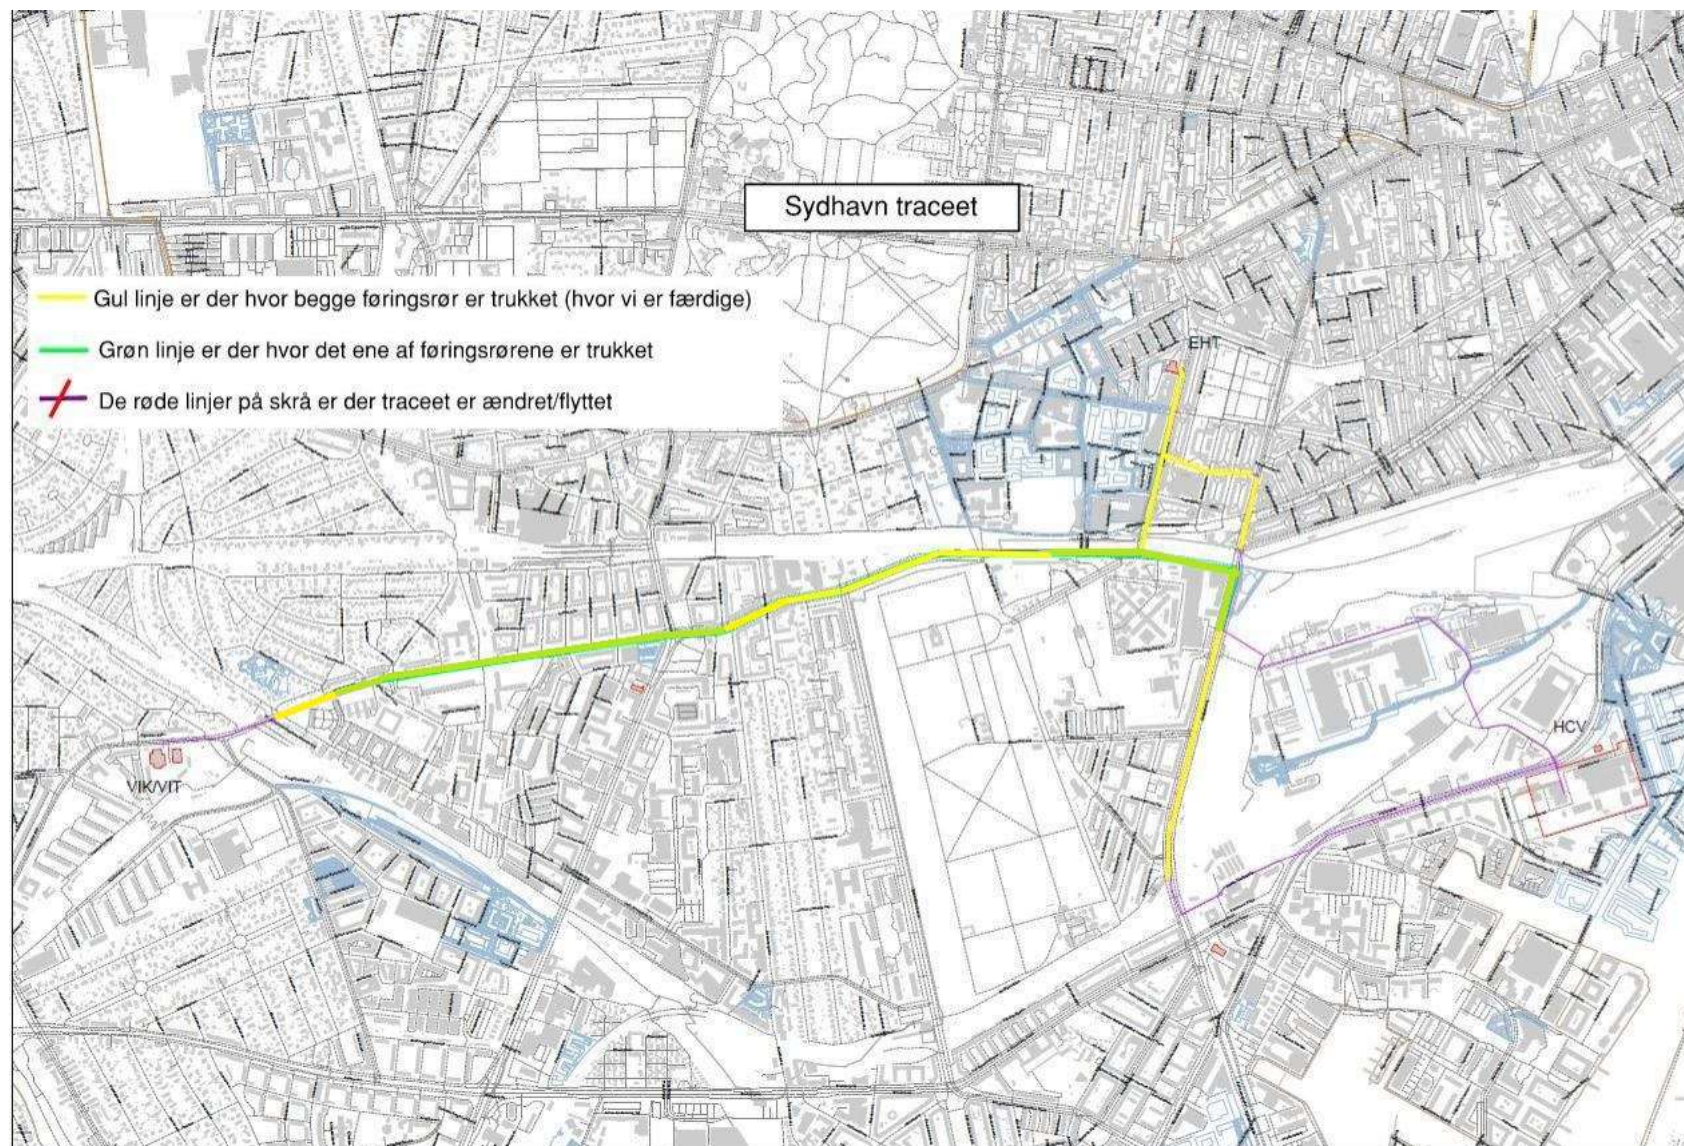



6 Eventuelt

- Thomas Saron undersøger hvad det vil koste grundejerforeningen af udskifte de nuværende fortovsfliser til 10 cm kørebanefliser, når fortovet skal reetableres efter gravning.
- Det blev aftalt på mødet at bygherre udskifter fliserne der ligger rundt om hjørnet til Grækenlandsvej udskiftes, når fortovet reetableres efter endt gravning.
- Det omtalte link vedr. vejejerne som Thomas Saron havde modtaget fra Københavns kommune videresendes ikke som aftalt. Ene og alene af den grund at man skal være ansat i Københavns kommune for at kunne bruge det.
- Ingen mandskabsvogne må parkeres på fortovet på Adriansvej.
